

Sprint 6

Mentoria PPL

2025

César Augusto de Fázio



Acompanhando o Desenvolvimento do Produto



Nesta sprint, o produto está enfim em desenvolvimento. Vamos ver o dia-a-dia do Product Owner com foco em gestão do produto, priorização, fluxo contínuo, alocação eficiente e tomada de decisão baseada em métricas.

Redefinindo as Sprints

Para a realização do exercício, a Sprint 1 (de 30 dias) foi dividida em 4 Sprints (de 7 dias).

Iterations	Start Date	End Date
▼ ERP Mentoria PPL	...	
Sprint 1	01/12/2025	07/12/2025
Sprint 2	08/12/2025	14/12/2025
Sprint 3	15/12/2025	21/12/2025
Sprint 4	22/12/2025	28/12/2025

Conheça Nosso Time



Analistas de Negócio

Analisam a viabilidade da história de usuário e validam a através de testes com critérios de aceite.
Temos 3 analistas.



Desenvolvedores

Desenvolvem o produto através de realização de tarefas.
Temos 4 desenvolvedores.



Testadores

Executam testes para validar o potencial Incremento em uma perspectiva técnica, assegurando-se que funciona conforme o esperado.
Temos 2 testadores.



Como Funciona

- Cada pessoa trabalha em uma tarefa por dia, somente em sua especialidade
- Uma pessoa só trabalha em uma demanda por dia
- Demandas devem seguir prioridade A → Z
- O PO registra diariamente as métricas nas duas planilhas
- Usa-se o Azure Devops e para cada sprint inicie a mesma e encerre no último dia (5)
- No início de cada Sprint o time está completo e totalmente disponível

Tabela de Demandas (Esforço por Etapa)



Demanda	Desenvolvimento	Testes	Validação
A	2	2	2
B	2	1	2
C	1	2	1
D	2	1	2
E	1	1	2
F	2	1	1
G	1	2	2
H	2	1	1

Tabela de Demandas (Esforço por Etapa)



Demanda	Desenvolvimento	Testes	Validação
I	1	1	1
J	2	1	1
K	1	1	2
L	1	1	2
M	1	1	2
N	2	2	1
O	2	1	2
P	2	1	1

Sprint 1



Dia 1

Test

BA

ERP Mentoria PPL Team

View as backlog

Board Analytics

Operacional

Filter by keyword

Types Assigned to States Area @CurrentIteration (+6) Tags Parent Work Item

backlog < Análise de Negócio 2/5 Em desenvolvimento 2/5 Fase de Testes 0/5 Validação 0/5 Encerrado <

New item

28 E User Story 0.1.1: Criar Conta

New

César Augusto de Fázio

Story Points 5

Target Date

Bloqueado

0/13

31 F User Story 0.2.1: Login e Acesso a Conta

New

César Augusto de Fázio

Story Points 3

25 C User Story 1.4.2: Marcar Itens Facilmente

Active

César Augusto de Fázio

Story Points 8

Target Date

Bloqueado

0/9

30 D User Story 0.1.3: Opções entre Métodos de Login

Active

César Augusto de Fázio

Story Points 13

17 A User Story 1.2.1: Criação de Lista

Active

César Augusto

Story Points 5

Target Date

Bloqueado

0/10

18 B User Story 1.2.2: Criar e editar novos itens

Active

César Augusto

Story Points 8

Dev

Dev

Dev

Dev

Dia 2

Dev

BA

ERP Mentoria PPL Team

View as backlog

Board Analytics

Operacional

Filter by keyword

Types Assigned to States Area @CurrentIteration (+6) Tags Parent Work Item

Backlog < Análise de Negócio 0/5 Em desenvolvimento 2/5 Fase de Testes 2/5 Validação 0/5 Encerrado <

New item

28 E User Story 0.1.1: Criar Conta

New

César Augusto de Fázio

Story Points 5

Target Date

Bloqueado

0/13

31 F User Story 0.2.1: Login e Acesso a Conta

New

César Augusto de Fázio

Story Points 3

Target Date

25 C User Story 1.4.2: Marcar Itens Facilmente

Active

César Augusto de Fázio

Story Points 8

Target Date

Bloqueado

0/9

Dev

30 D User Story 0.1.3: Opções de Login

New

César Augusto de Fázio

Story Points 8

Target Date

Dev

17 A User Story 1.2.1: Criação de Lista

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points 5

Target Date

Bloqueado

0/10

Test

18 B User Story 1.2.2: Adicionar e editar novos itens

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points 8

Target Date

Test

Dev Dev Dev Dev

BA

BA

Test

Test

The image shows a Jira Kanban board with the following columns and items:

- Backlog**: 3 items (32, 34, 35).
- Análise de Negócio** (2/5): 2 items (28, 31).
- Em desenvolvimento** (0/5): 0 items.
- Fase de Testes** (3/5): 3 items (17, 25, 30). Items 17 and 25 are highlighted with yellow boxes and labeled "Test".
- Validação** (1/5): 1 item (18). Item 18 is highlighted with a blue box and labeled "BA".
- Encerrado**: 0 items.


Each item card displays the following information:

- Item ID and Title (e.g., 32 G User Story 0.2.2: Recuperação de Senha).
- Status (e.g., New, Active, Testing, Resolved).
- Assignee (César Augusto de Fázio).
- Story Points (e.g., 8, 5, 13).
- Target Date.
- Bloqueado toggle switch.
- Progress bar (e.g., 0/8, 0/13, 0/10, 0/7, 0/9, 0/19).


Imprevisto: Carlos testou VR e torceu o pescoço → só 3 devs disponíveis

Dia 4

BA

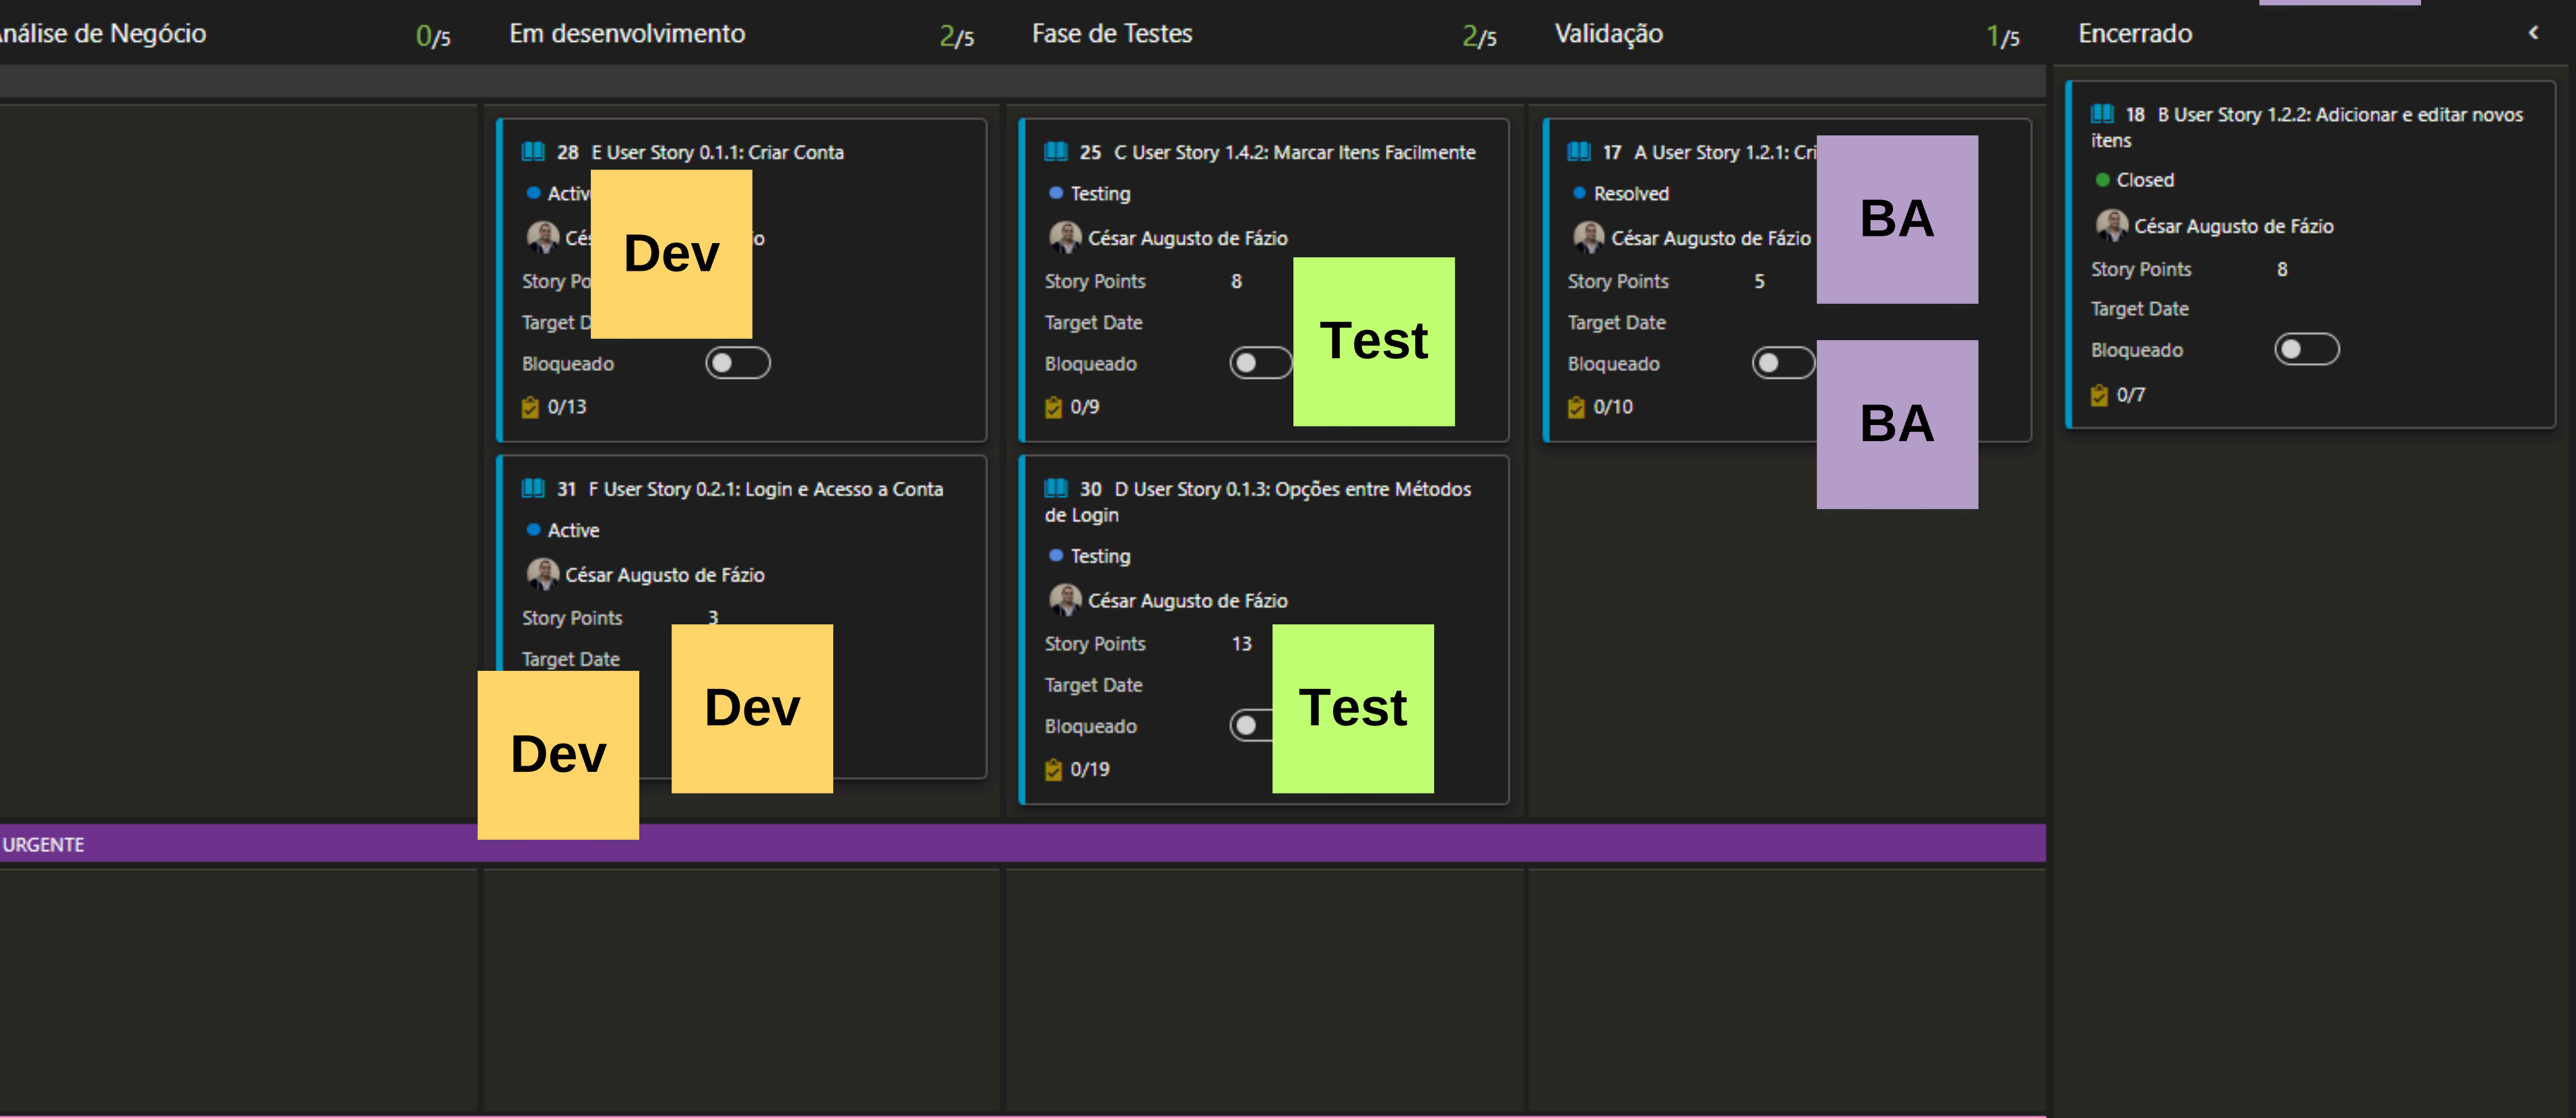

Dia 5

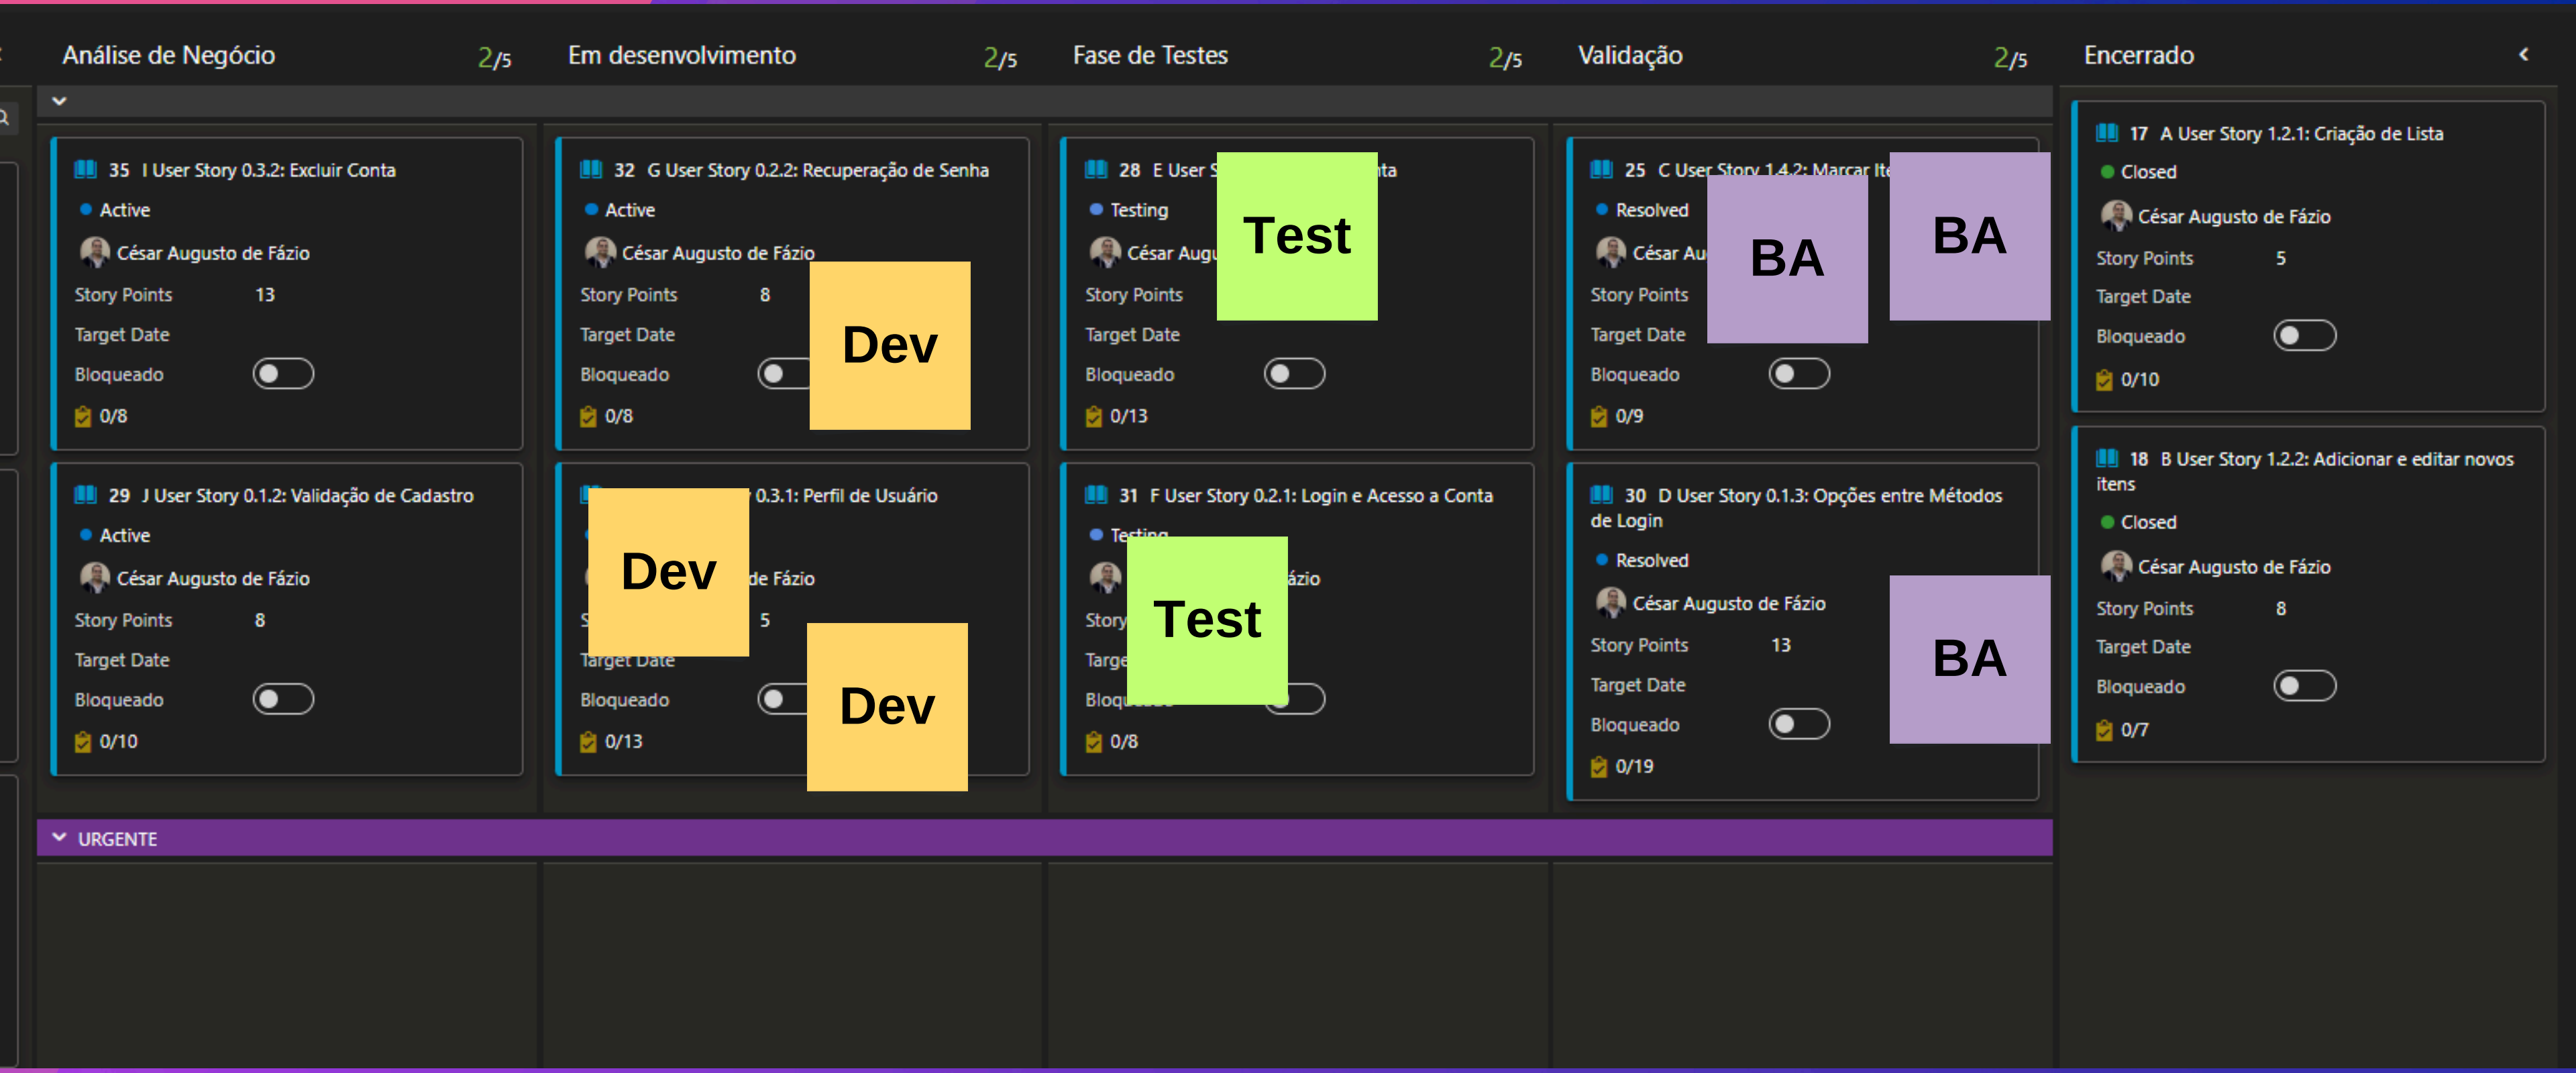



Histórias de Usuário Concluídas na Sprint 1


- **A User Story 1.2.1:** Criação de Lista
- **B User Story 1.2.2:** Adicionar e editar novos itens
- **C User Story 1.4.2:** Marcar Itens Facilmente
- **D User Story 0.1.3:** Opções entre Métodos de Login

Sprint 2




Imprevisto: Marina desapareceu no debate de bolo: testador indisponível

Dia 7

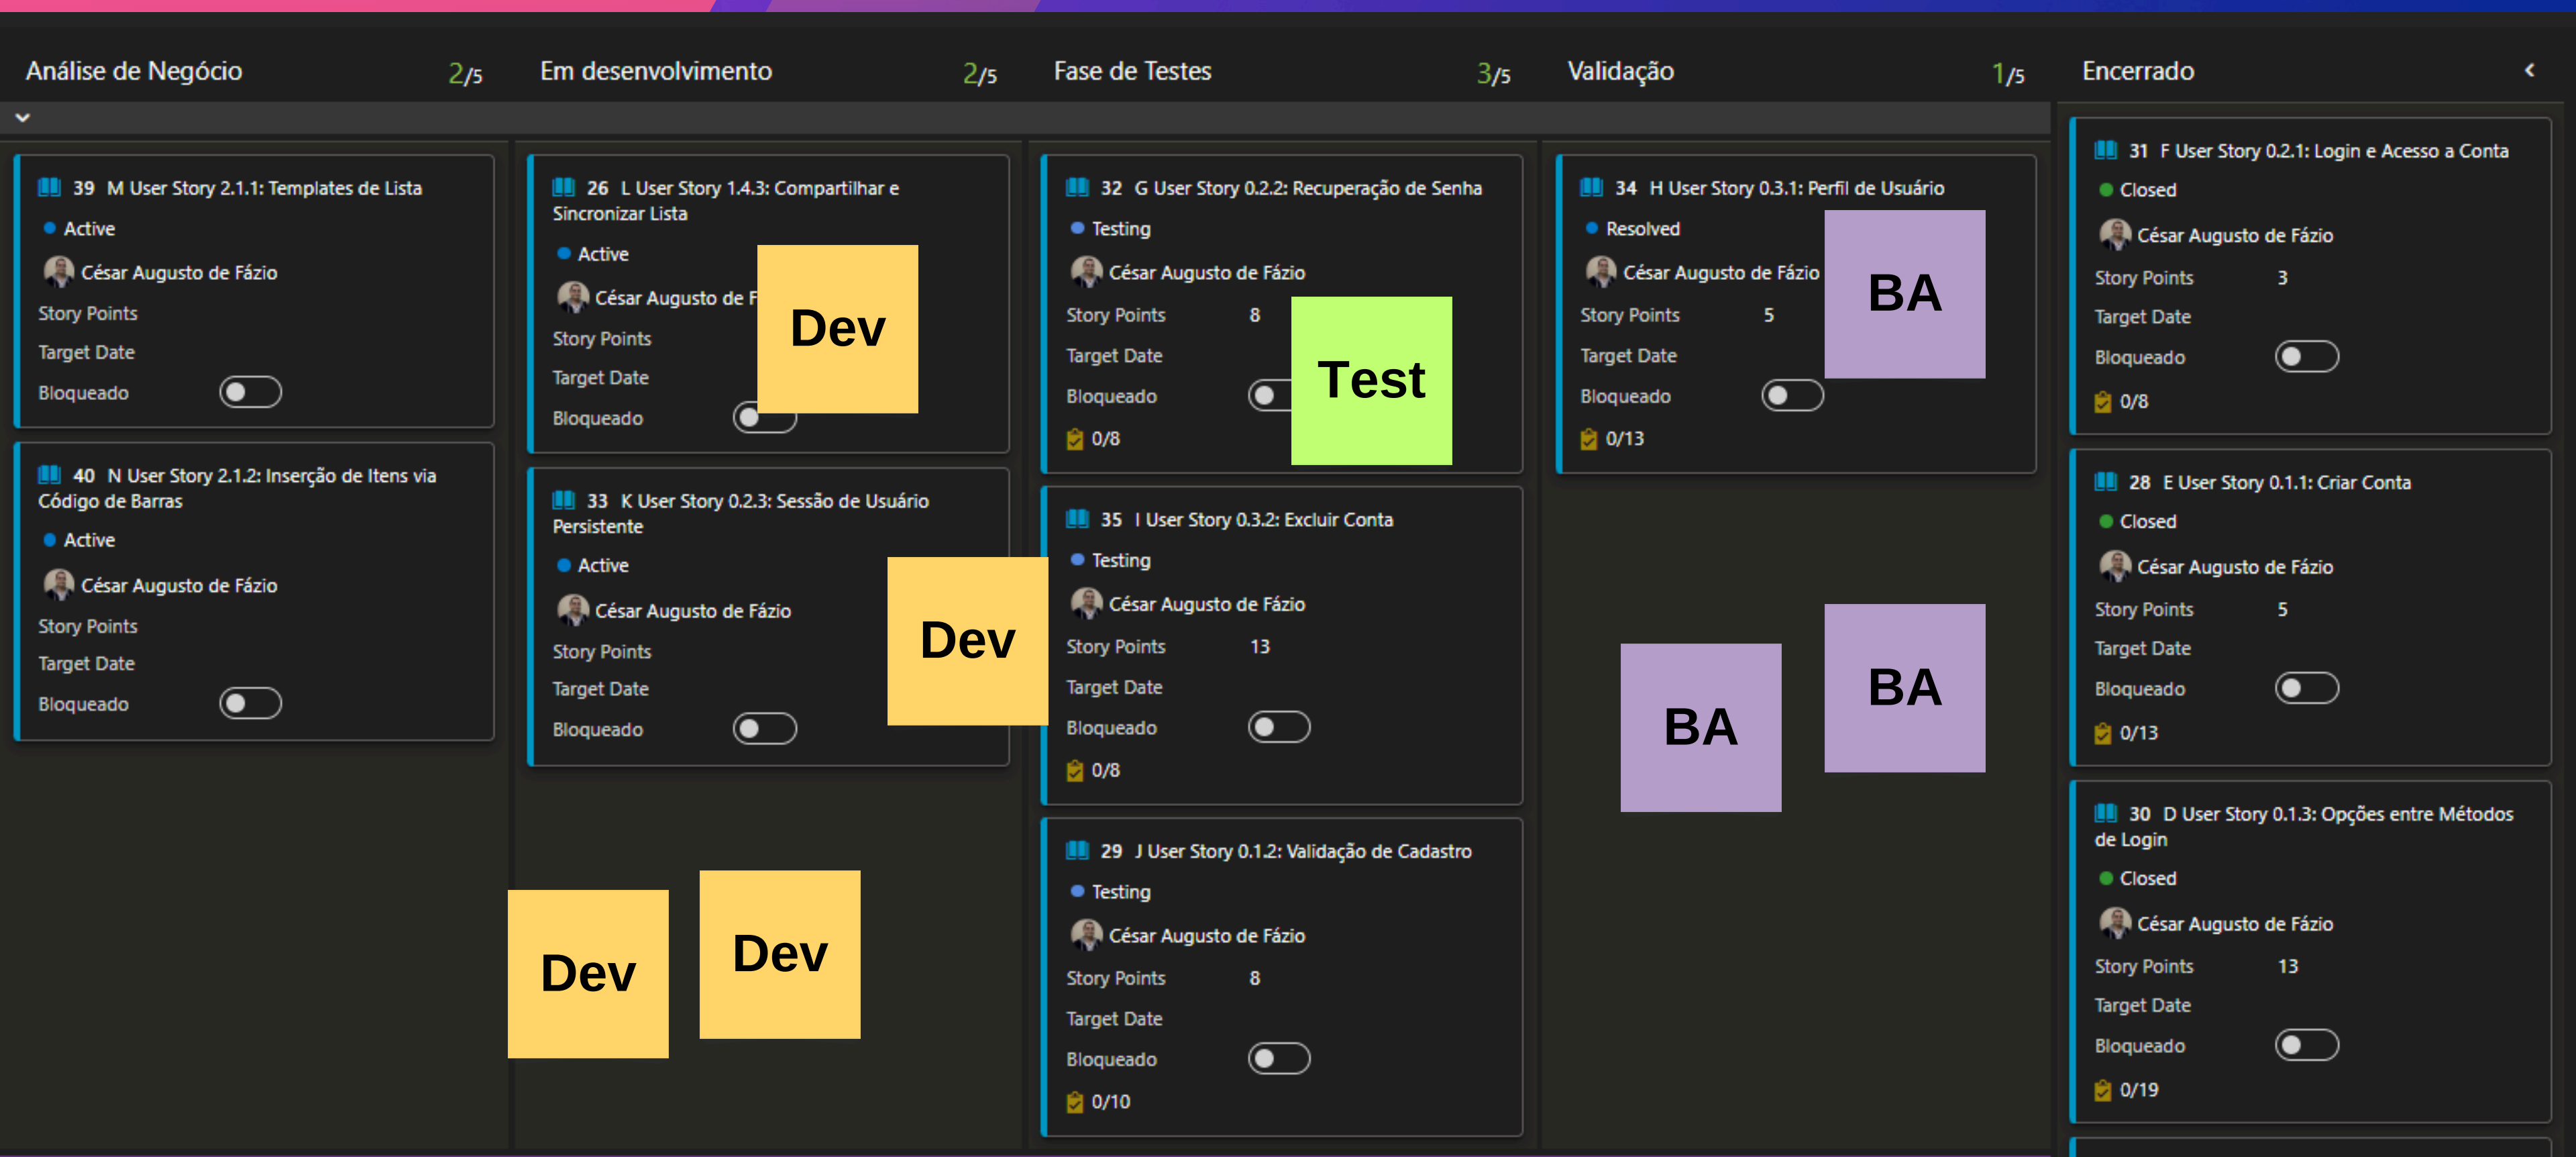

Imprevisto: Pedro dormiu sobre o teclado: só 3 devs disponíveis

Dia 8

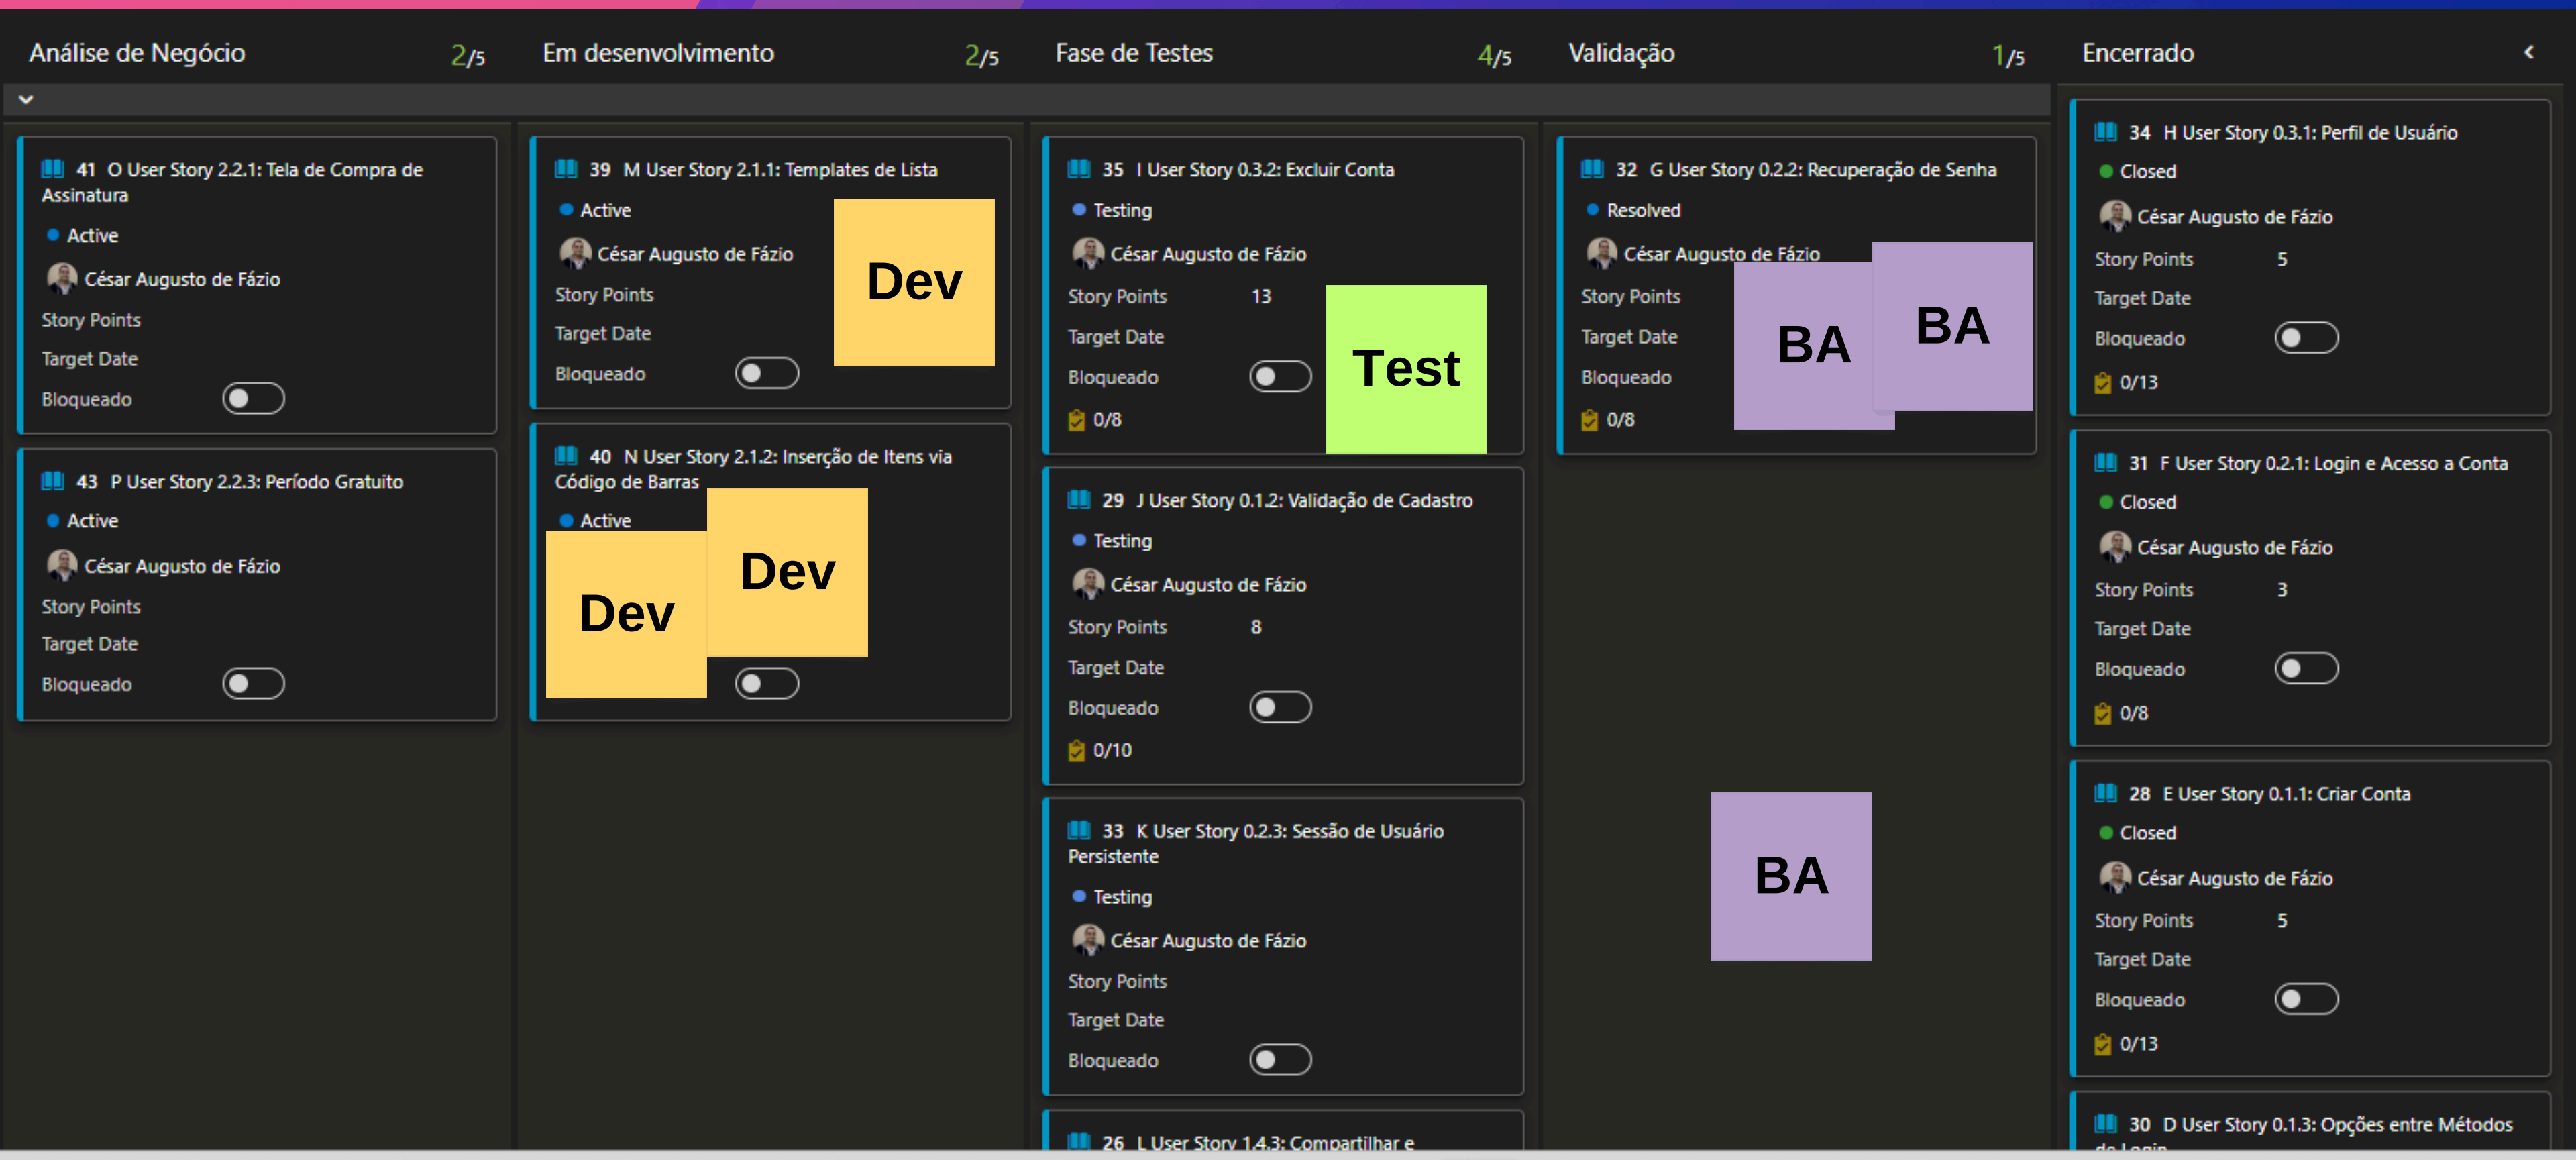

Dia 9

Análise de Negócio 2/5 Em desenvolvimento 2/5 Fase de Testes 5/5 Validação 1/5 Encerrado <

42

Q

User Story 2.2.2: Assinatura Recorrente

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

24

R

User Story 1.4.1: Uso facilitado da lista de compras

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

41

O

User Story 2.2.1: Tela de Compra de Assinatura

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Dev

Dev

43

P

User Story 2.2.3: Período Gratuito

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Dev

29

J

User Story 0.1.2: Validação de Cadastro

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

0/10

33

K

User Story 0.2.3: Sessão de Usuário Persistente

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Test

26

L

User Story 1.4.3: Compartilhar e Sincronizar Lista

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

39

M

User Story 2.1.1: Templates de Lista

35

I

User Story 0.3.2: Excluir Conta

Resolved

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

0/8

BA

33

K

User Story 0.2.3: Sessão de Usuário Persistente

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Test

BA

BA

32

G

User Story 0.2.2: Recuperação de Senha

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

0/8

34

H

User Story 0.3.1: Perfil de Usuário

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

0/13

31

F

User Story 0.2.1: Login e Acesso a Conta

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

0/8

28

E

User Story 0.1.1: Criar Conta

Dia 10

Análise de Negócio2/5Em desenvolvimento2/5Fase de Testes5/5Validação1/5Encerrado

24 R User Story 1.4.1: Uso facilitado da lista de compras

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

11 S User Story 1.1.1: Gerar Notificação Programada e Proativa

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

43 P User Story 1.3.1: Acesso Gratuito

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

42 Q User Story 2.2.2: Assinatura Recorrente

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

29 J User Story 0.1.2: Validação de Cadastro

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points8

Target Date

Bloqueado

0/10

26 L User Story 1.4.3: Compartilhar e Sincronizar Lista

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

39 M User Story 2.1.1: Templates de Lista

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

40 N User Story 2.1.2: Inserção de Itens via Código de Barras

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

33 K User Story 0.2.3: Sessão de Usuário Persistente

Resolvida

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

34 H User Story 0.3.1: Perfil de Usuário

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points5

Target Date

Bloqueado

0/13

35 I User Story 0.3.2: Excluir Conta

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points13

Target Date

Bloqueado

0/8

32 G User Story 0.2.2: Recuperação de Senha

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points8

Target Date

Bloqueado

0/8

31 F User Story 0.2.1: Login e Acesso a Conta

Closed

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Dev

Dev

Dev

Test

BA

BA

BA




Histórias de Usuário Concluídas na Sprint 2

- **E User Story 0.1.1:** Criar Conta
- **F User Story 0.2.1:** Login e Acesso a Conta
- **G User Story 0.2.2:** Recuperação de Senha
- **H User Story 0.3.1:** Perfil de Usuário
- **I User Story 0.3.2:** Excluir Conta
- **K User Story 0.2.3:** Sessão de Usuário Persistente

Sprint 3



Dia 12

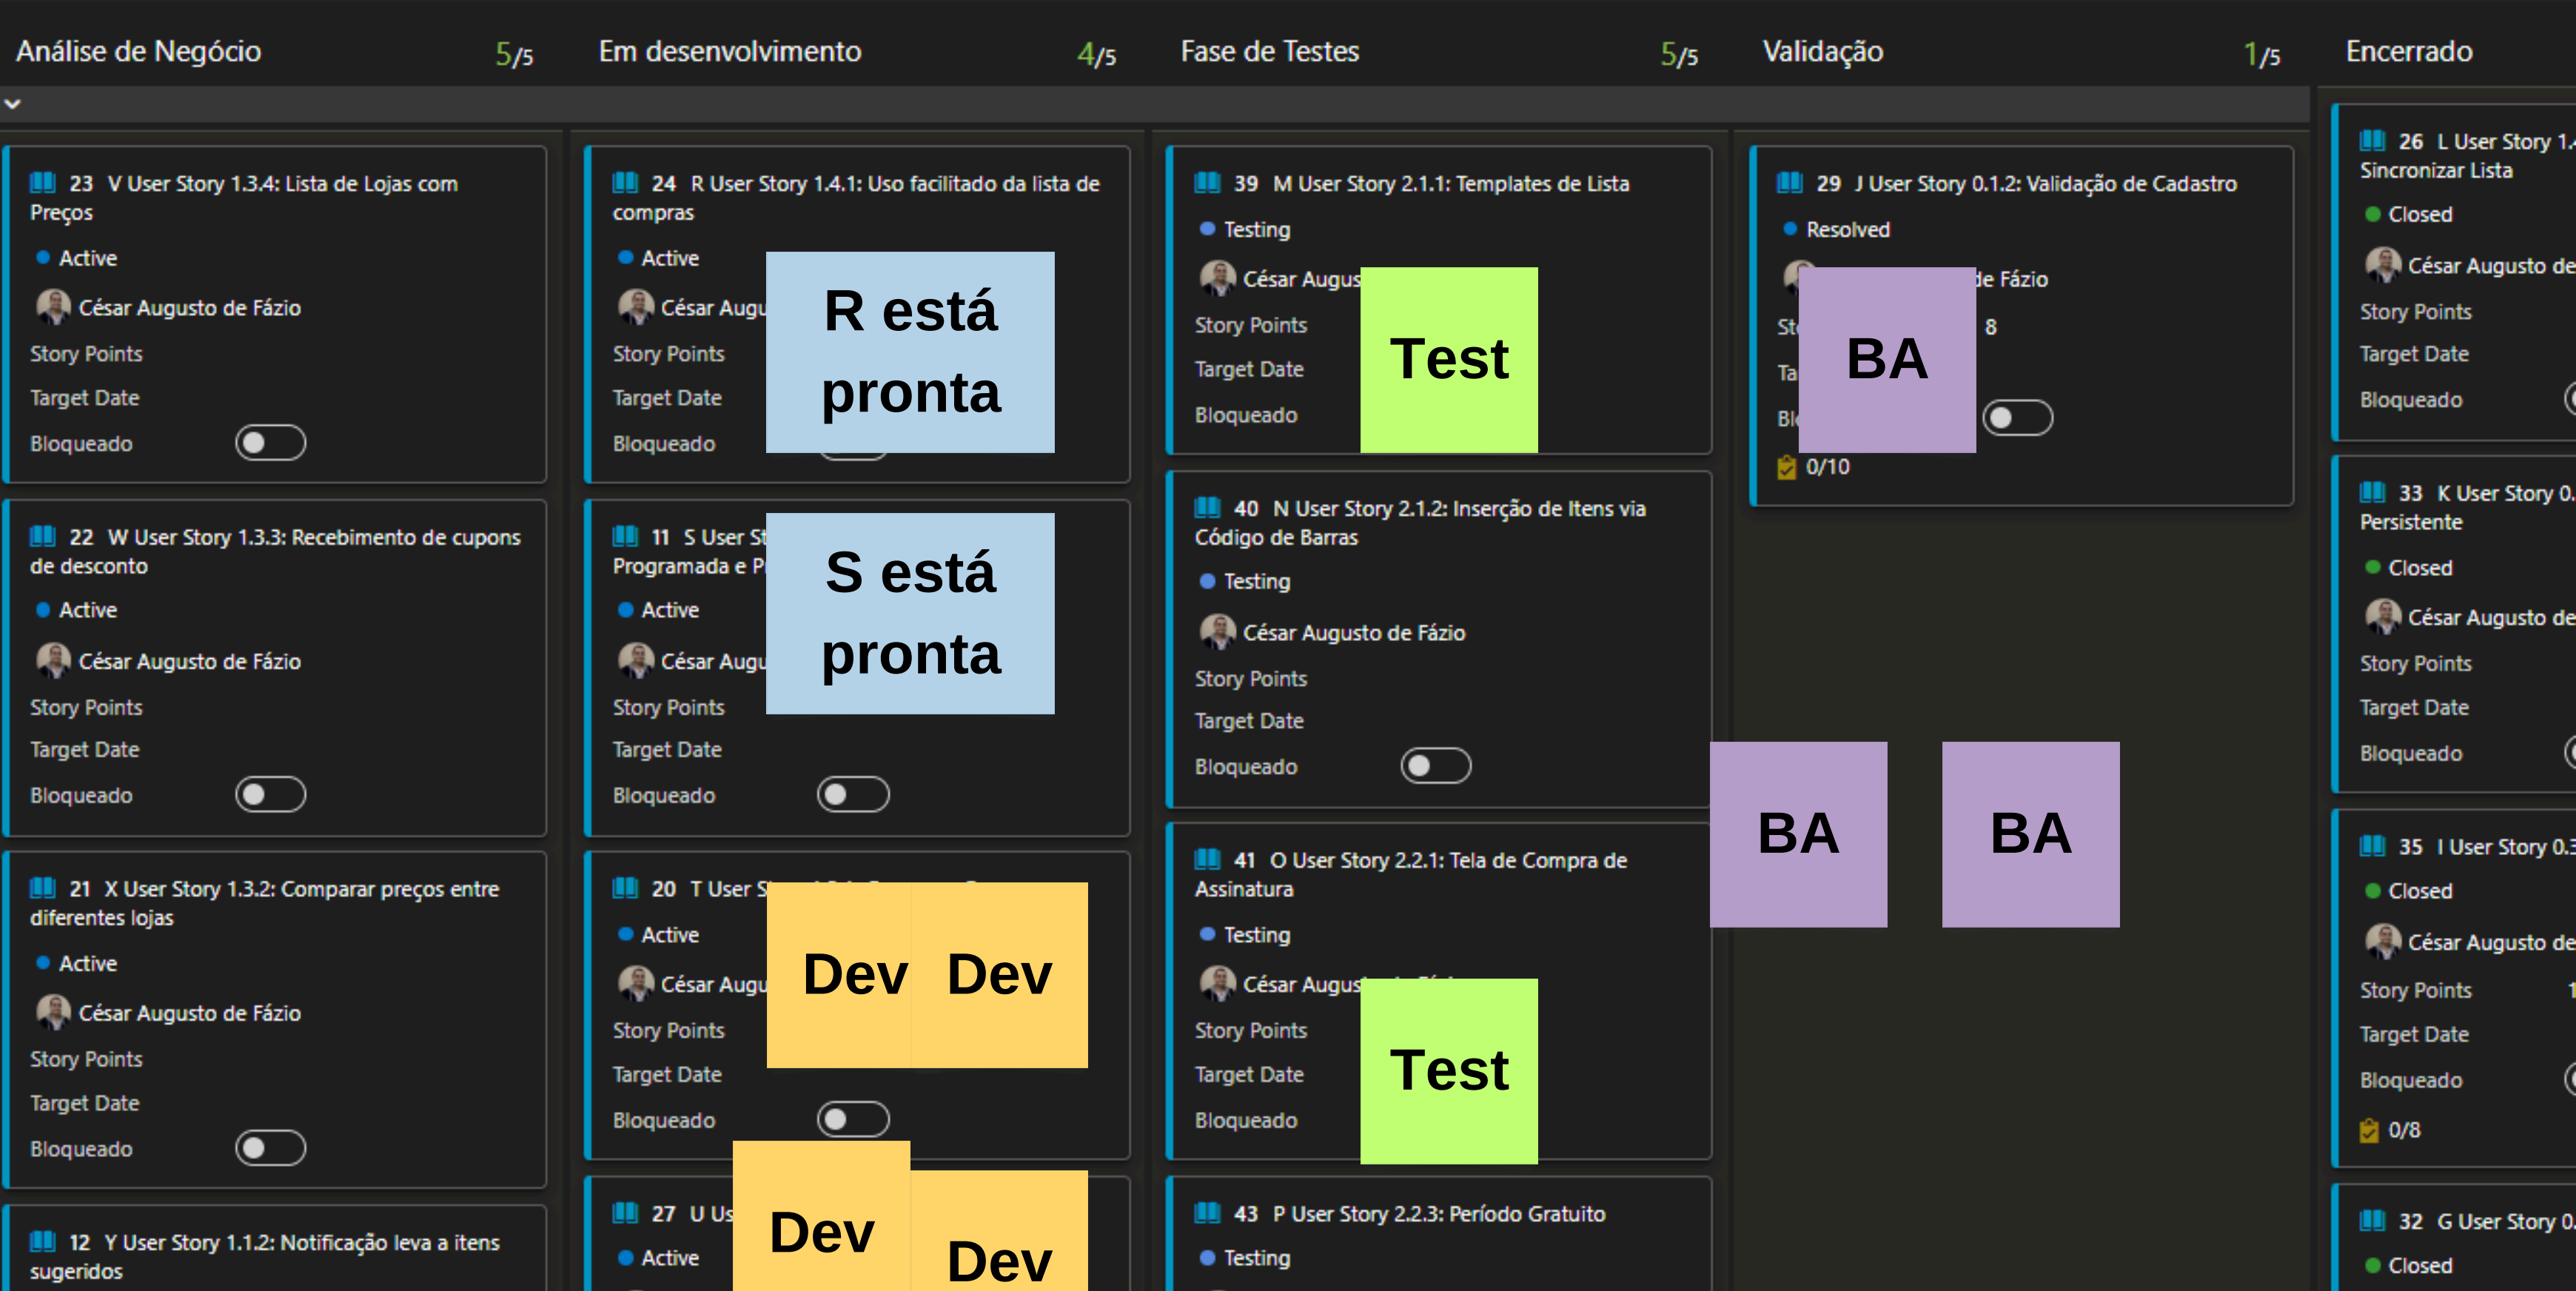

Dia 13

21 X User Story 1.3.2: Comparar preços entre diferentes lojas

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

12 Y User Story 1.1.2: Notificação leva a itens sugeridos

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

19 Z User Story 1.2.3: Sugestões Inteligentes de Itens

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

20 T User Story 1.3.1: Comparar Preços

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

T está pronta

27 U User Story 1.5.1: Análise de Economia

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

U está pronta

23 V User Story 1.3.4: Lista de Lojas com Preços

Active

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Dev

Dev

22 W User Story 1.3.3: Resposta de desconto

Active

Dev

Dev

40 N User Story 2.1.2: Inserção de Itens via Código de Barras

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Test

43 P User Story 2.2.3: Período Gratuito

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Test

42 Q User Story 2.2.2: Assinatura Recorrente

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

Test

24 R User Story 1.4.1: Uso facilitado da lista de compras

Testing

39 M User Story 2.1.1: Templates de Lista

Resolved

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado

BA

BA

41 O User Story 2.2.1: Tela de Compra de Assinatura

Resolved

César Augusto de Fázio

Story Points


Target Date

Bloqueado

BA



Imprevisto: Testadora virou chatbot e desapareceu: -1 testadora

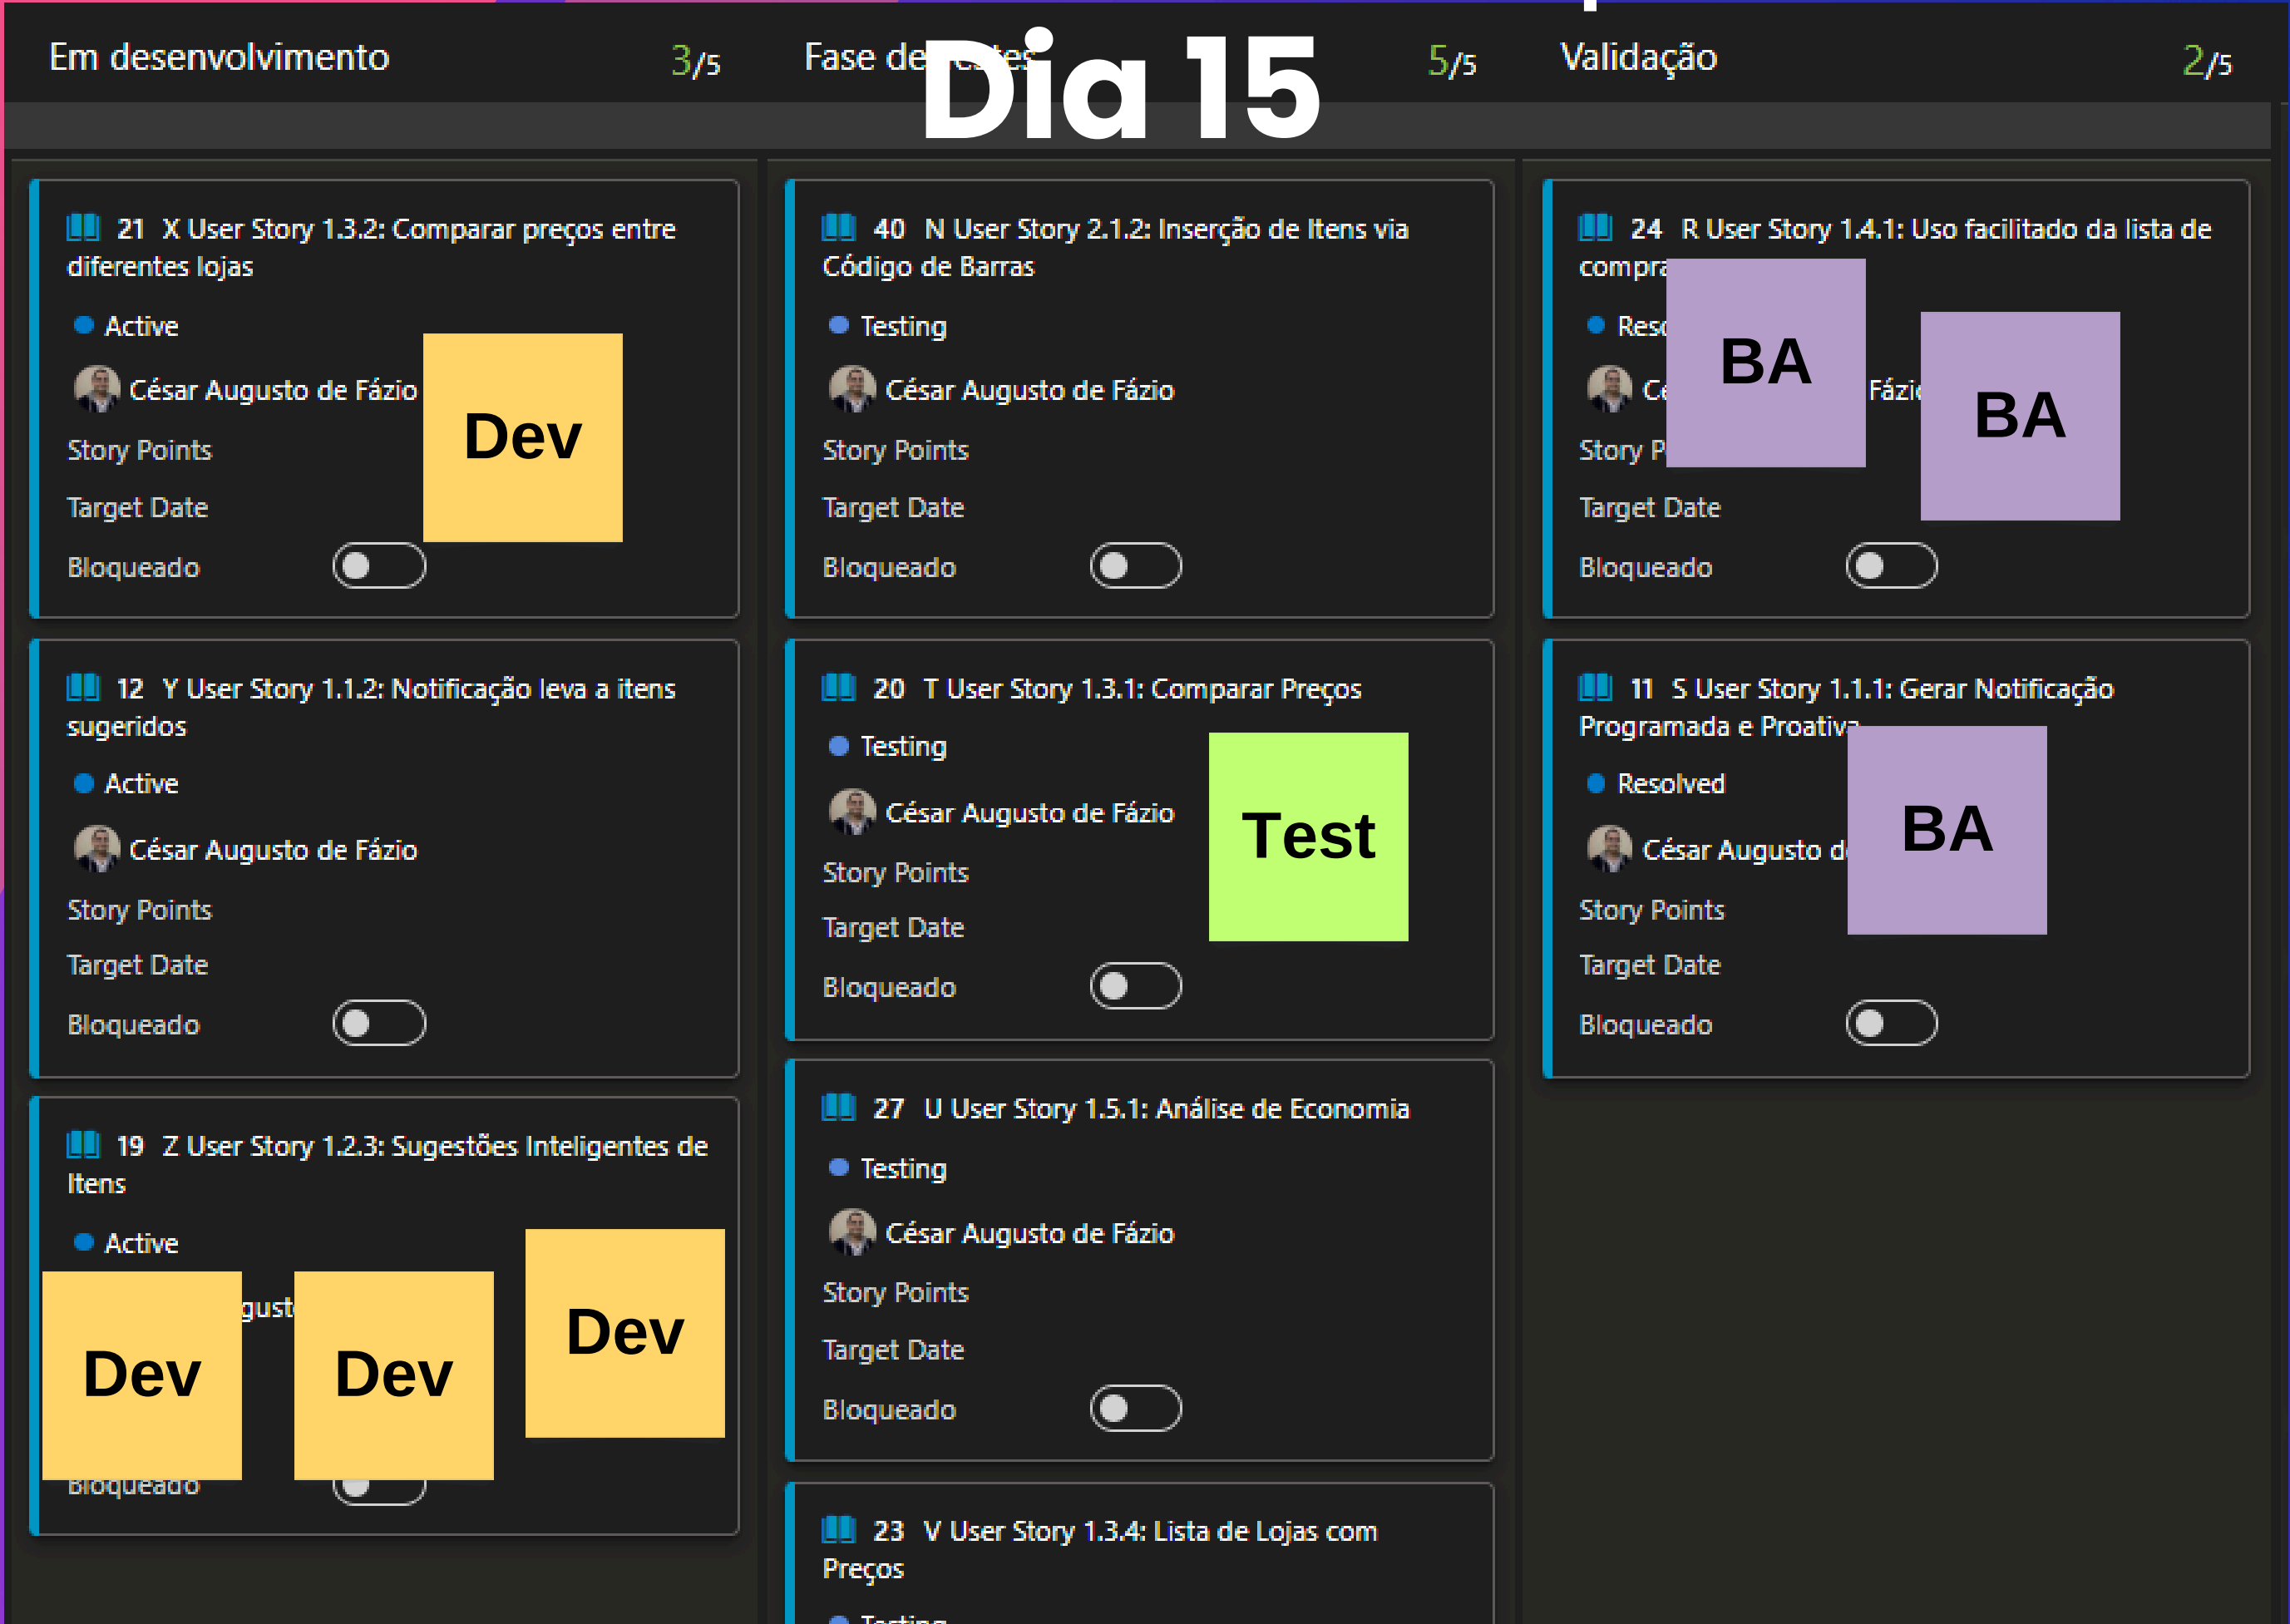



Histórias de Usuário Concluídas na Sprint 3

- **L User Story 1.4.3:** Compartilhar e Sincronizar Lista
- **M User Story 2.1.1:** Templates de Lista
- **O User Story 2.2.1:** Tela de Compra de Assinatura
- **P User Story 2.2.3:** Período Gratuito
- **Q User Story 2.2.2:** Assinatura Recorrente
- **R User Story 1.4.1:** Uso facilitado da lista de compras
- **S User Story 1.1.1:** Gerar Notificação Programada e Proativa

Sprint 4



Dia 16

Em desenvolvimento

2/5

Fase de Testes

5/5

Validação

1/5

12 Y User Story 1.2.1: Adicionar itens a sugestões

Active

César Augusto de Fazio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Dev

19 Z User Story 1.2.3: Sugestões Inteligentes de Itens

Dev

Dev

Dev

Bloqueado



40 N User Story 2.1.2: Inserção de Itens via Código de Barras

Test

César Augusto de Fazio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

Test

27 U User Story 1.5.1: Análise de Economia

Testing

César Augusto de Fazio

Story Points

Target Date

Bloqueado



23 V User Story 1.3.4: Lista de Lojas com Preços

Testing

César Augusto de Fazio

Story Points

Target Date

Bloqueado



22 W User Story 1.3.3: Recebimento de cupons de desconto

20 T User Story 1.3.1: Comparar Preços


Resolved

César Augusto de Fazio

Story Points

Target Date


Bloqueado



BA

BA

BA

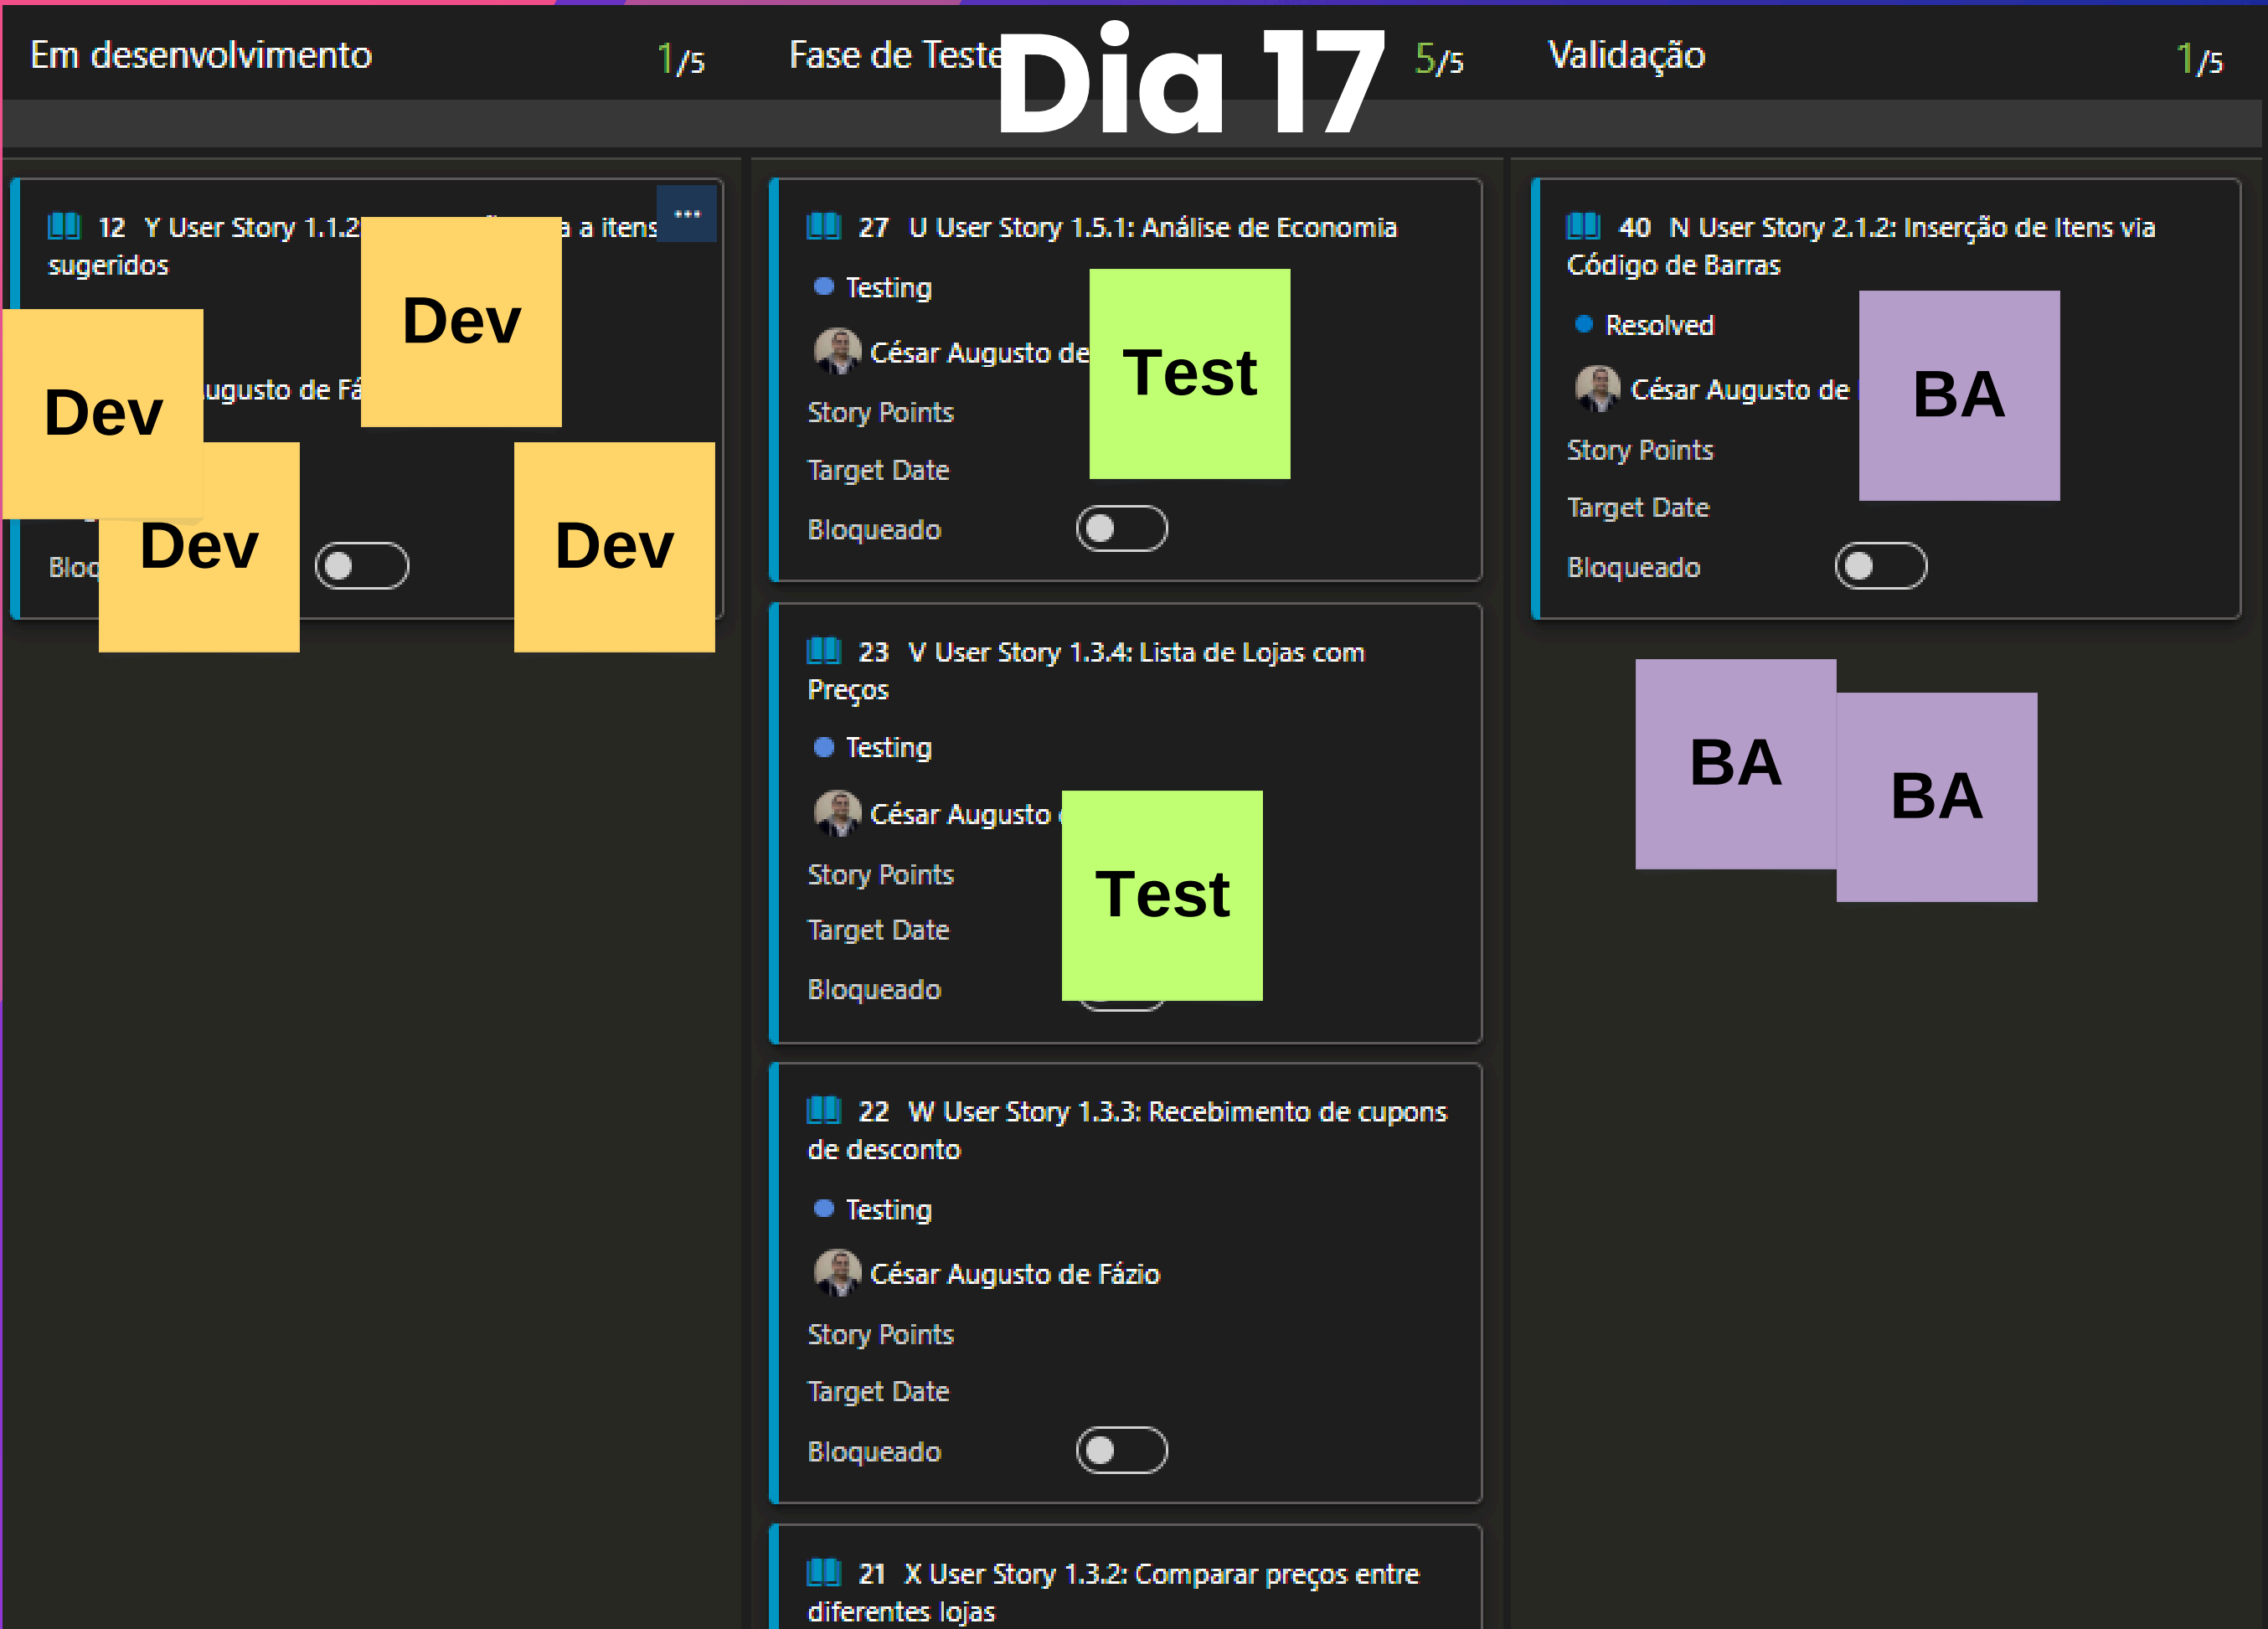

Dia 17

Dia 18

Fase de Testes

Validação

2/5

22 W User Story 1.3.3: Recebimento de cupons de desconto

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

21 X User Story 1.3.2: Comparar preços entre diferentes lojas

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

12 Y User Story 1.1.2: Notificação leva a itens sugeridos

Testing

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



19 Z User Story 1.2.3: Sugestões Inteligentes de Itens

Testing

César Augusto de Fázio

27 U User Story 1.5.1: Análise de Economia

Resolved

César Augusto

Story Points

Target Date

Bloqueado

BA

BA

23 V User Story 1.3.4: Lista de Lojas com Preços

Resolved

César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



BA

Dia 19

Fase de Testes

3/5

Validação

1/5

 21 X User Story 1.3.2: Comparar preços entre diferentes lojas

• Testing

 César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

 12 Y User Story 1.1.2: Notificação leva a itens sugeridos


• Testing

 César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

 19 Z User Story 1.2.3: Sugestões Inteligentes de Itens

• Testing

 César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



 22 W User Story 1.3.3: Recebimento de cupons de desconto

• Resolved

 César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



BA

BA

BA

Dia 20

Fase de Testes

2/5

Validação

1/5

12 Y User Story 1.1.2: Notificação leva a itens sugeridos

Testing



César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



Test

Test

19 Z User Story 1.2.3: Sugestões Inteligentes de Itens

Testing



César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



21 X User Story 1.3.2: Comparar preços entre diferentes lojas

Resolved




César Augusto de Fázio

Story Points

Target Date

Bloqueado



BA

BA

BA



Histórias de Usuário Concluídas na Sprint 4

- **N User Story 2.1.2:** Inserção de Itens via Código de Barras
- **T User Story 1.3.1:** Comparar Preços
- **U User Story 1.5.1:** Análise de Economia
- **V User Story 1.3.4:** Lista de Lojas com Preços
- **W User Story 1.3.3:** Recebimento de cupons de desconto
- **X User Story 1.3.2:** Comparar preços entre diferentes lojas


Vazão Semanal

Produtividade

A equipe mostrou uma capacidade de acelerar seu trabalho, alcançando alto desempenho na Sprint 3. O resultado da Sprint 4 sugere que a equipe está se estabilizando em uma vazão média entre 6 e 8 histórias por semana.

Vazão


O desafio agora não é apenas aumentar a vazão, mas sim torná-la mais previsível e consistente no alto desempenho que demonstraram na Sprint 3.

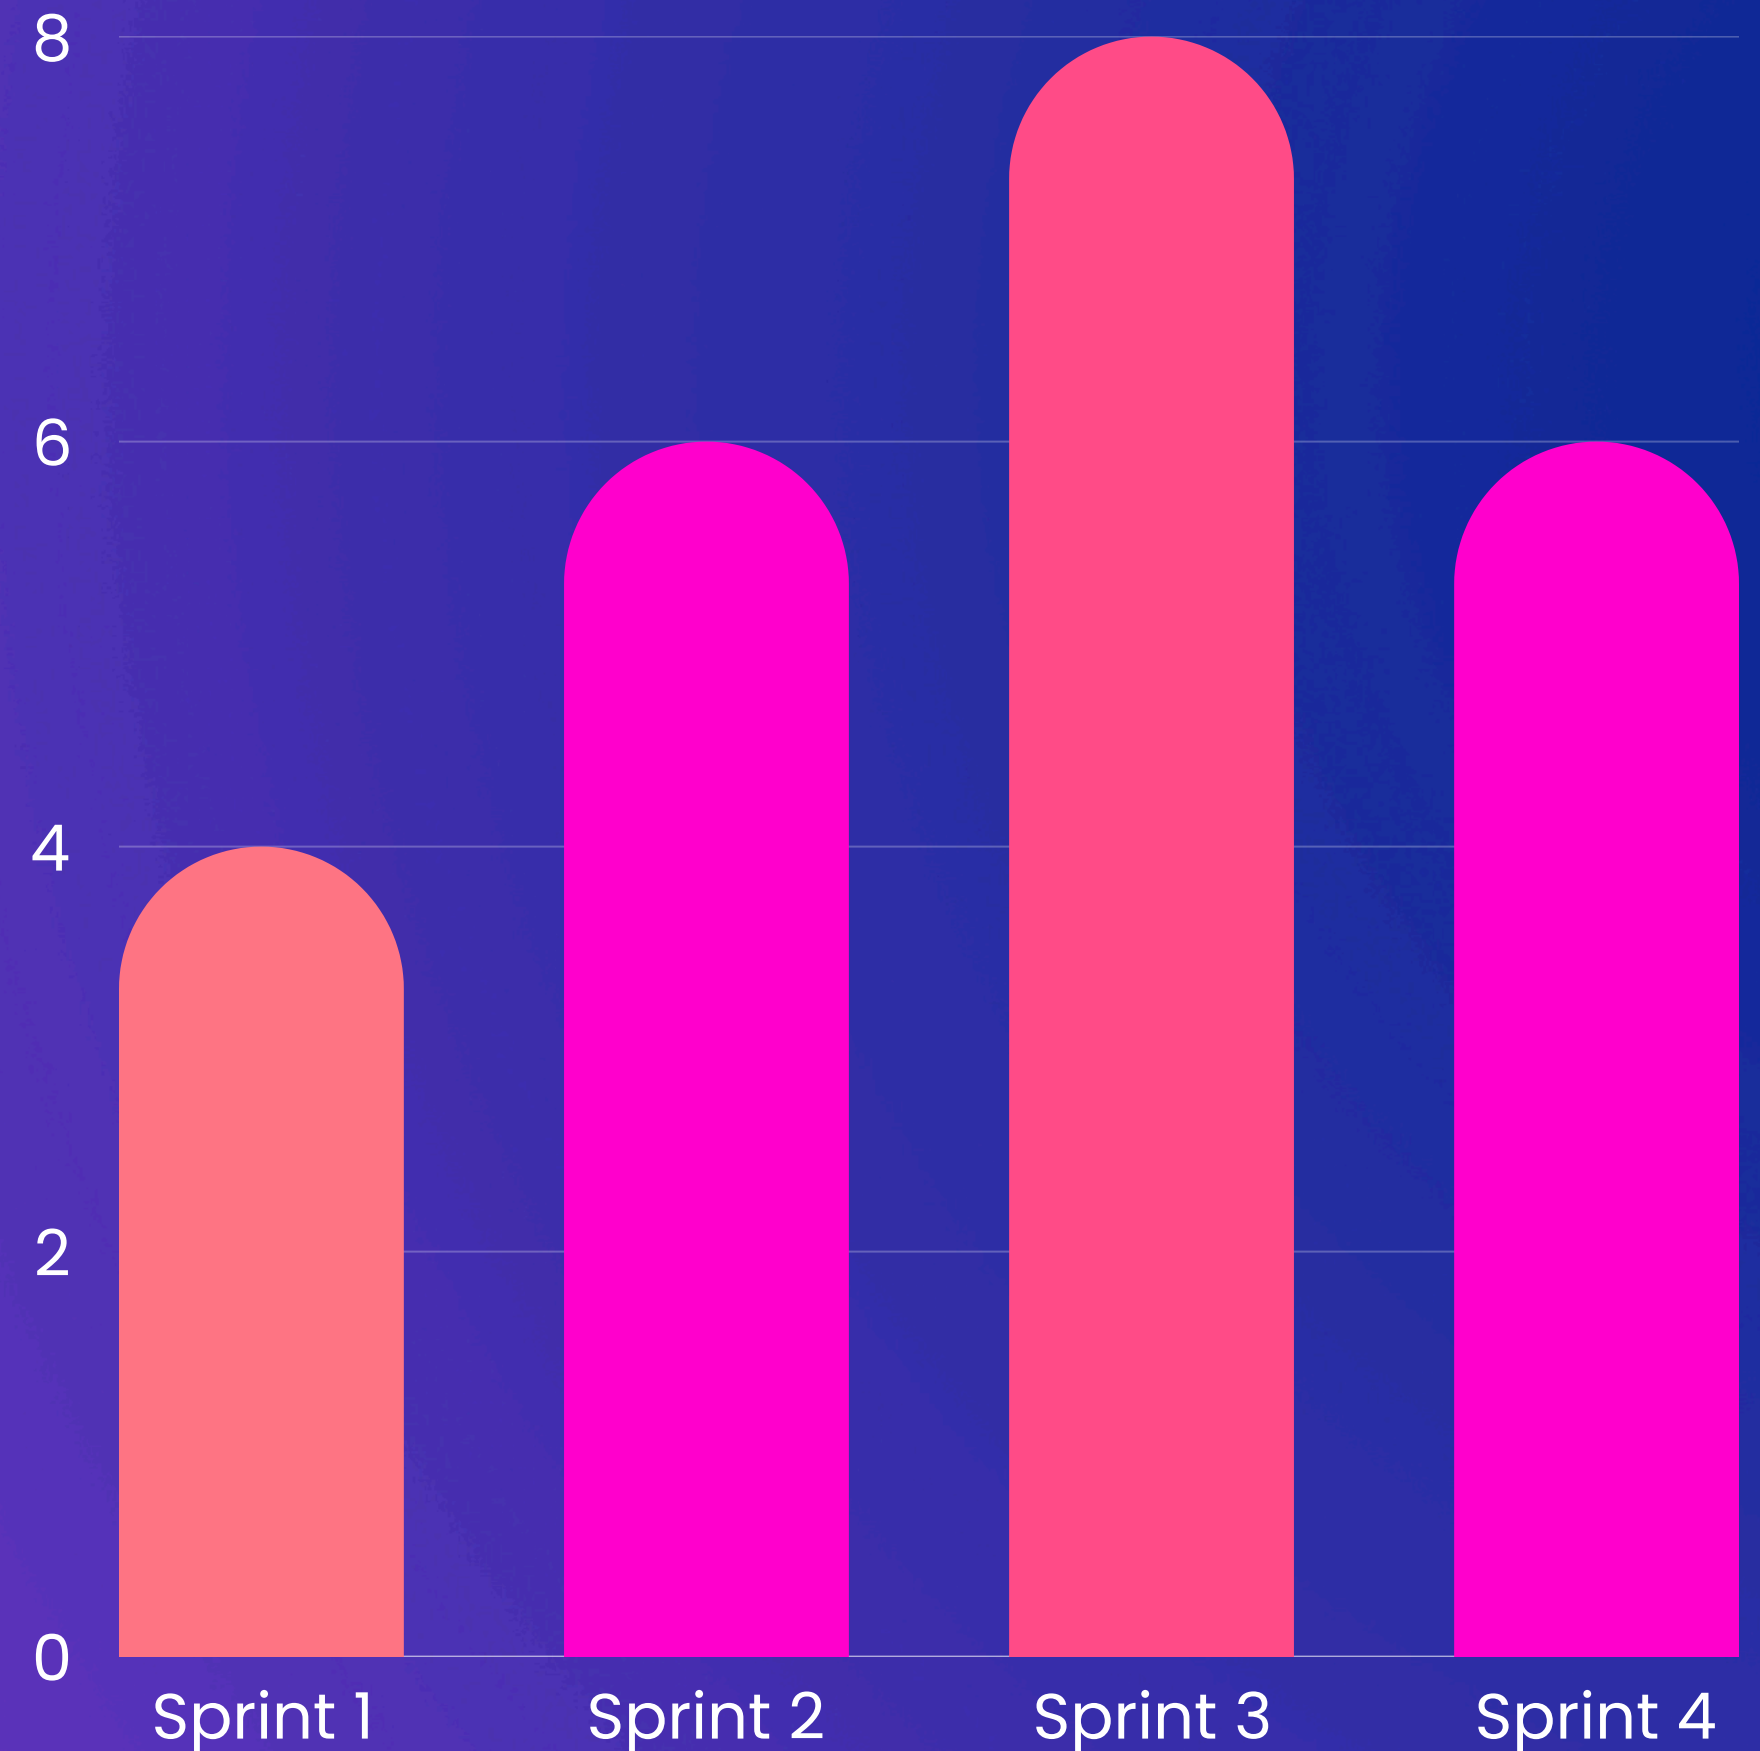

Distribuição de Leadtime



Trabalho em Progresso

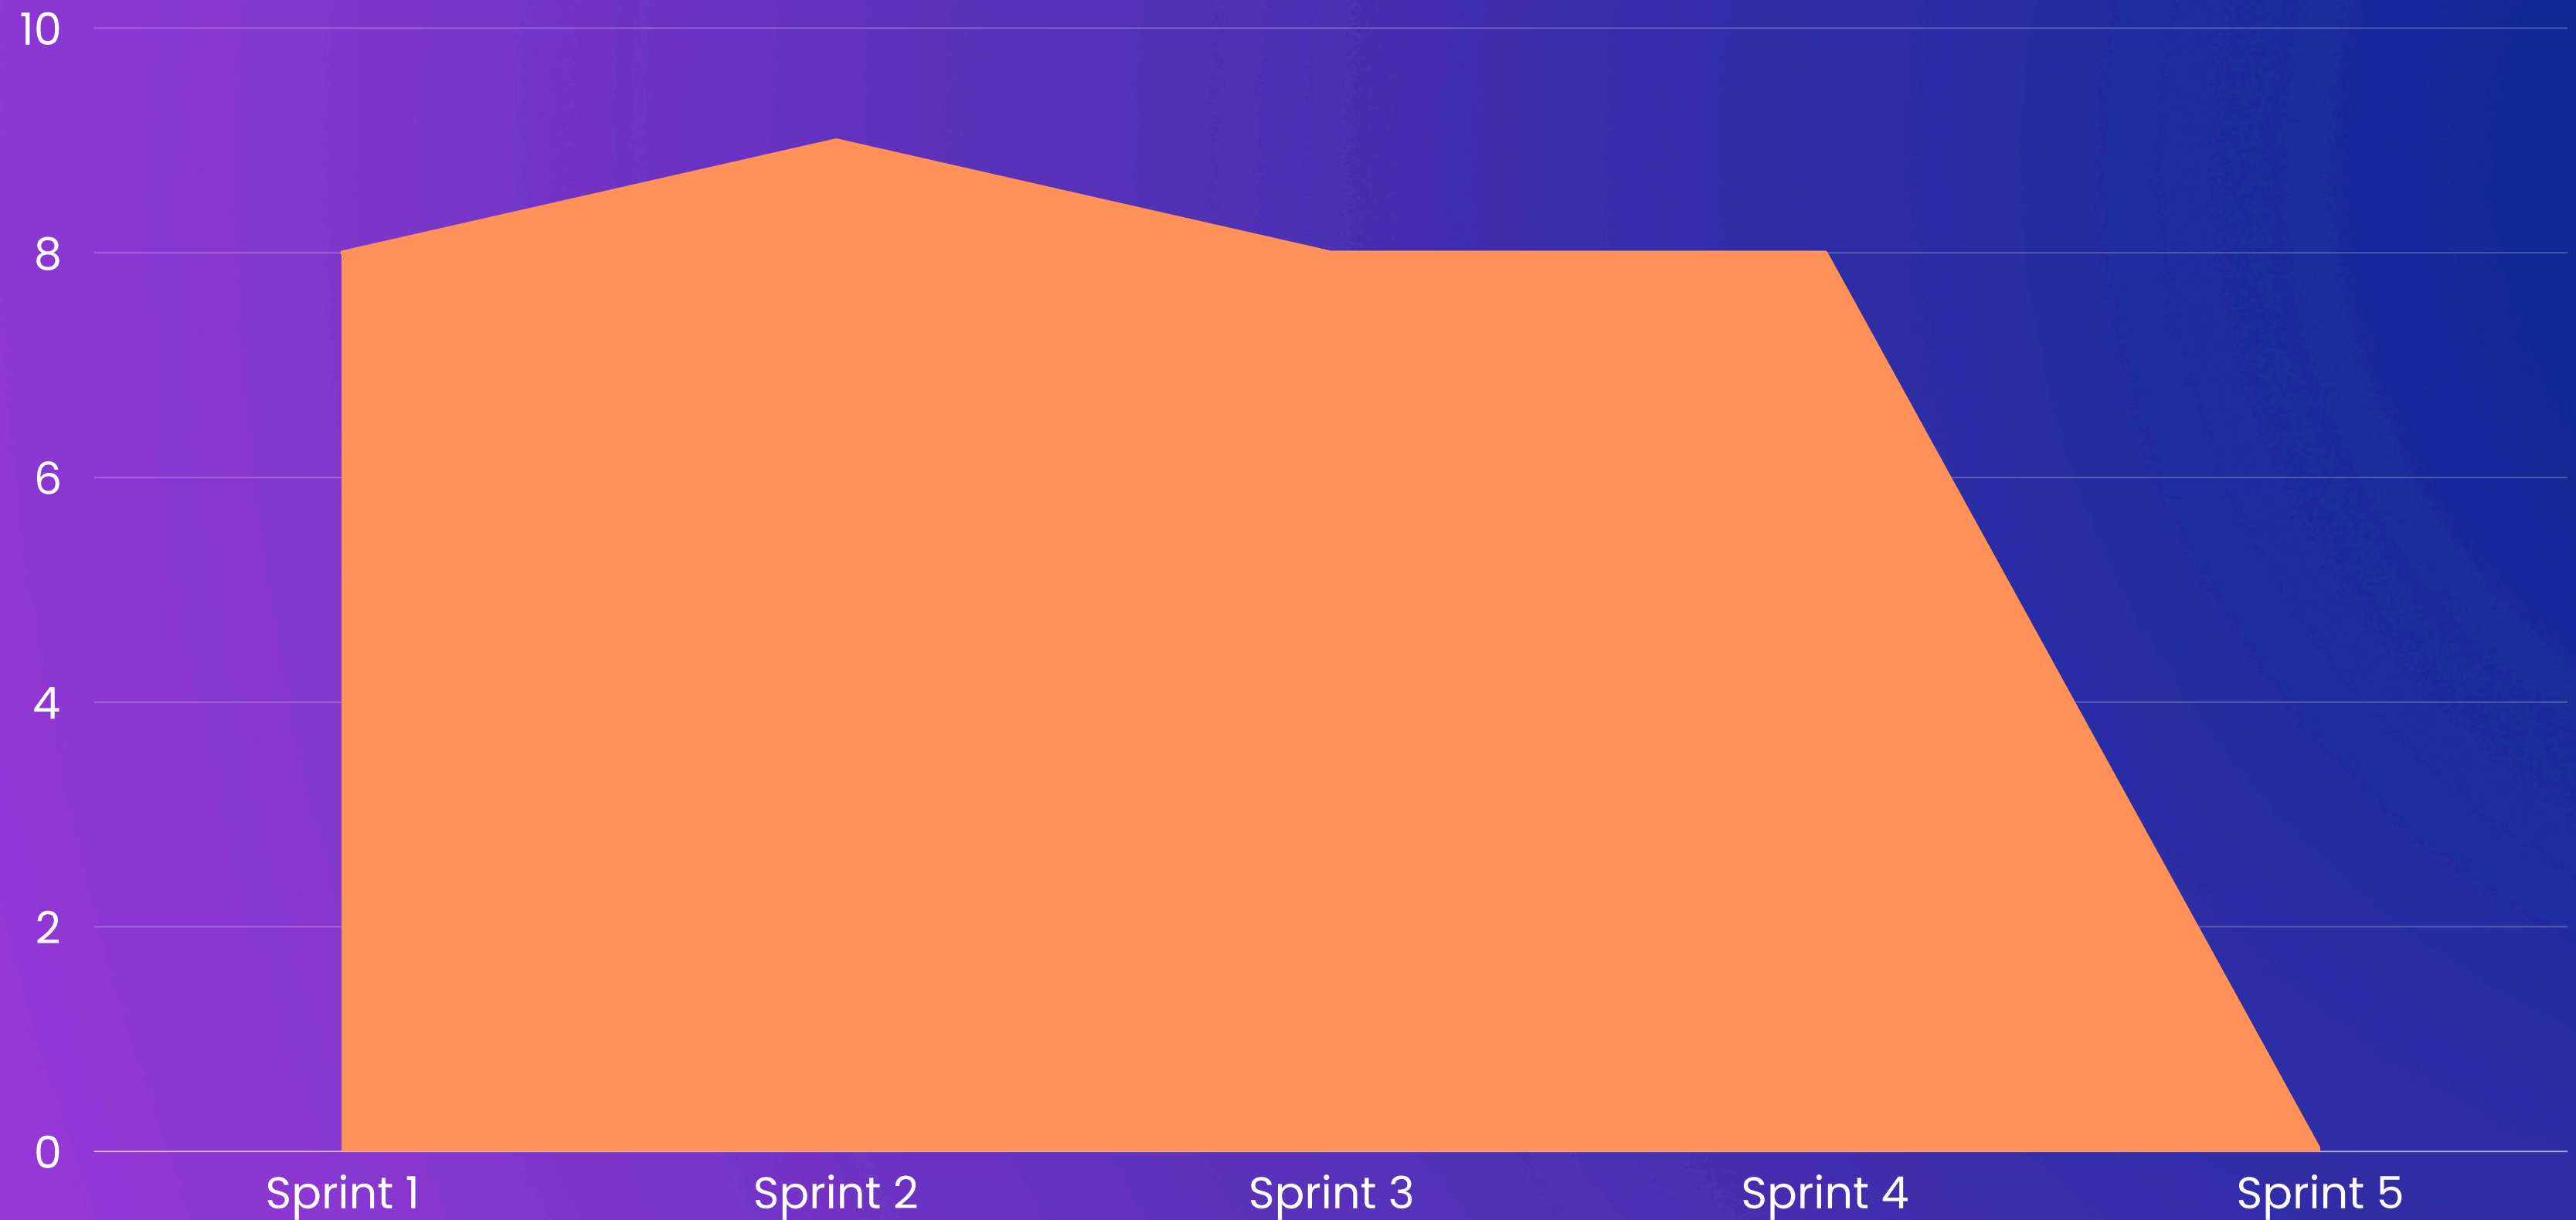

Consulta Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD)

